

**ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
при подготовке к отопительному
сезону
по тепловым сетям МУПЭС
г.Дивногорска
за 2025 год**

Капитальный ремонт участка ТС от ТК- 14 до здания школы №4, ул. Набережная,9

Тепловая сеть от электростанции «Центральная»

Год ввода в эксплуатацию: 1966


Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 108мм

Диаметр обратного трубопровода: 108мм

Протяженность участка тепловой сети: 83,9м

Протяженность замененного трубопровода: 167,8м

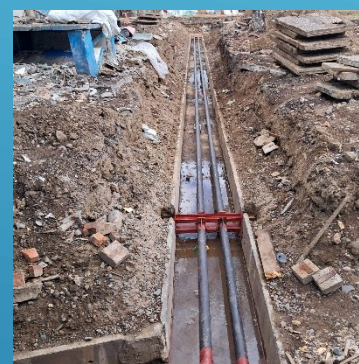

Капитальный ремонт участка ТС от ТК-24 до ТК-26 ул. Бочкина

Тепловая сеть от электростанции №14

Год ввода в эксплуатацию: 1966

Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 219мм

Диаметр обратного трубопровода: 219мм

Протяженность участка тепловой сети: 60м

Протяженность замененного трубопровода: 120м



Капитальный ремонт участка ТС от ТК-19 до здания детской поликлиники, ул. 30 лет Победы, 20

Тепловая сеть от электростанции №12

Год ввода в эксплуатацию: 1984

Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 108мм

Диаметр обратного трубопровода: 108мм

Протяженность участка тепловой сети: 31м

Протяженность замененного трубопровода: 62м



Капитальный ремонт участка ТС от ТК-20 до ТК-21, в районе ул. Чкалова,43

Тепловая сеть от электростанции ул.Заводская,13/1

Год ввода в эксплуатацию: 1974

Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 325мм

Диаметр обратного трубопровода: 325мм

Протяженность участка тепловой сети: 141м

Протяженность замененного трубопровода: 282м



Капитальный ремонт участка ТС от ТК-14 до жилого дома ул.Школьная,8, с. Овсянка

Тепловая сеть от уг. котельной с . Овсянка.

Год ввода в эксплуатацию: 1986


Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 108мм

Диаметр обратного трубопровода: 108мм

Протяженность участка тепловой сети: 95м

Протяженность замененного трубопровода: 190м

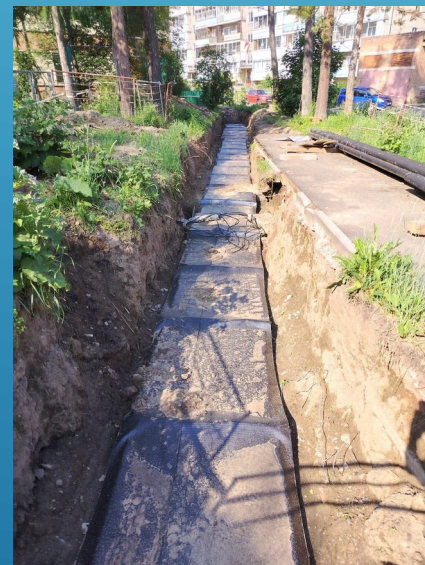

Замена оборудования на уг. котельных в с.Овсянка.


с.Овсянка:

- Произведены работы по замене уг. котла марки Квр-1.16
- Произведена замена дымососа Д-10



Замена оборудования на уг. котельных в п.Усть-Мана

- Произведена замена устаревшего угольного котла Квр-0,63 на новый Квр-1.16

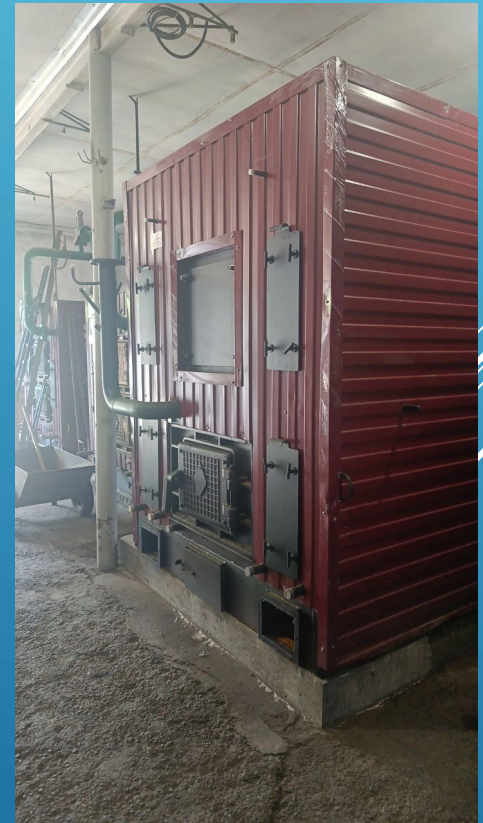

Капитальный ремонт участка ТС от ТК-2 до жилого дома по ул. Комсомольская, 25, п. Усть-Мана

Год ввода в эксплуатацию: 2010г

Система теплоснабжения: двухтрубная

Диаметр подающего трубопровода: 40мм

Диаметр обратного трубопровода: 40мм

Протяженность участка тепловой сети: 35м

Протяженность замененного трубопровода: 35

Труба предизолированная «Изопрофлекс- тандем»



Плановый ремонт оборудования эл.котельных

Плановый ремонт эл.котельных - 7шт.

Плановый ремонт ЦТП-3шт.

Плановый ремонт угольных котельных - 2шт.

Ремонт эл.котлов- 57шт.

Ремонт насосного оборудования - 40шт.

